
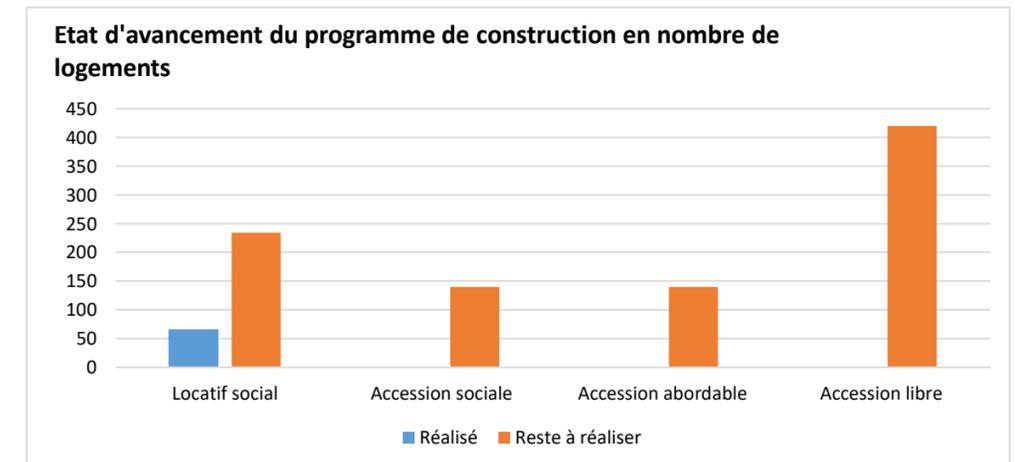


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	25920	30%	1883	7%	24037	93%
Accession sociale	12096	14%	0	0%	12096	100%
Accession abordable	12096	14%	0	0%	12096	100%
Accession libre	36288	42%	0	0%	36288	100%
Sous total logements	86 400	100%	1883	7%	84 517	98%
Commerces - services - activi	10 200		0	0%	10 200	100%
Total	96 600		0	0%	96 600	100%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

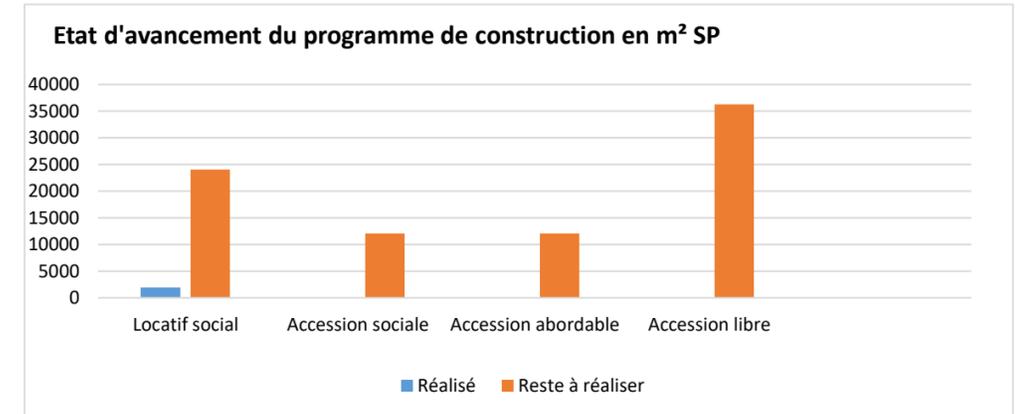

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Locatif social	300		66	22%	234	78%
Accession sociale	140		0	0%	140	100%
Accession abordable	140		0	0%	140	100%
Accession libre	420		0	0%	420	100%
Sous total logements	1000		66	22%	934	93%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières
