


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	29 485	34%	4 160	14%	25 325	86%
PLAI	8 845	9%	1 248		7 597	
PLUS	20 639	25%	2 912		17 727	
PLS	-	-	-			
Accession sociale	12 520	15%	2 530	20%	9 990	80%
Accession abordable	7 472	9%	2 359	32%	5 113	68%
Accession libre	36 691	43%	4 372	12%	32 319	88%
Sous total logements	86 167		13 420	16%	72 747	84%
Commerces et activités	7 477		2 150	29%	5 327	71%
Total	93 645		15 571	17%	78 074	83%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

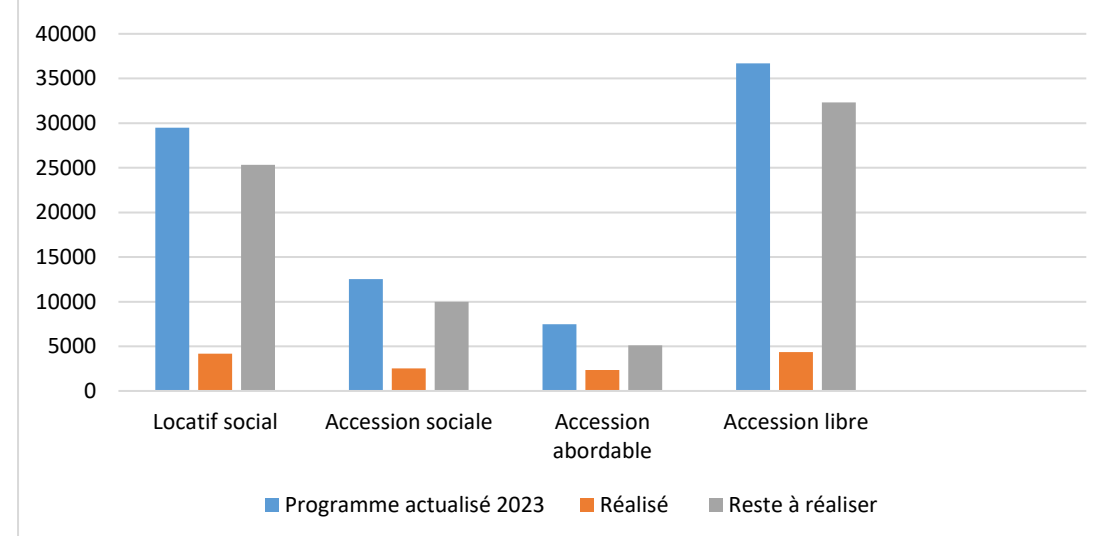

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2023		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
				%		%
Locatif social	430		63	15%	367	85%
PLAI	129		19		110	
PLUS	301		44		257	
PLS	-		-		-	
Accession sociale	176		34	19%	142	81%
Accession abordable	101		23	23%	78	77%
Accession libre	538		70	13%	468	87%
Sous total logements	1 245		190	15%	1 055	85%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

