


Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

| Nature du programme | Programme actualisé 2021 | | Etat d'avancement | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | Réalisé | | Reste à réaliser | |
| | m ² SP | % | m ² SP | % | m ² SP | % |
| Locatif social | 28 250 | 33% | 4 160 | 15% | 24 091 | 85% |
| PLAI | 8 475 | 9% | 1 248 | | 7 227 | |
| PLUS | 19 775 | 25% | 2 912 | | 16 863 | |
| PLS | - | - | - | | | |
| Accession sociale | 12 904 | 15% | 2 530 | 20% | 10 374 | 80% |
| Accession abordable | 8 575 | 10% | 2 359 | 28% | 6 216 | 72% |
| Accession libre | 35 030 | 41% | 4 372 | 12% | 30 658 | 88% |
| Sous total logements | 84 759 | | 13 420 | 16% | 84 503 | 84% |
| Commerces et activités | 8 166 | | 2 150 | 26% | 6 016 | 74% |
| Total | 92 926 | | 15 571 | 17% | 90 519 | 83% |

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

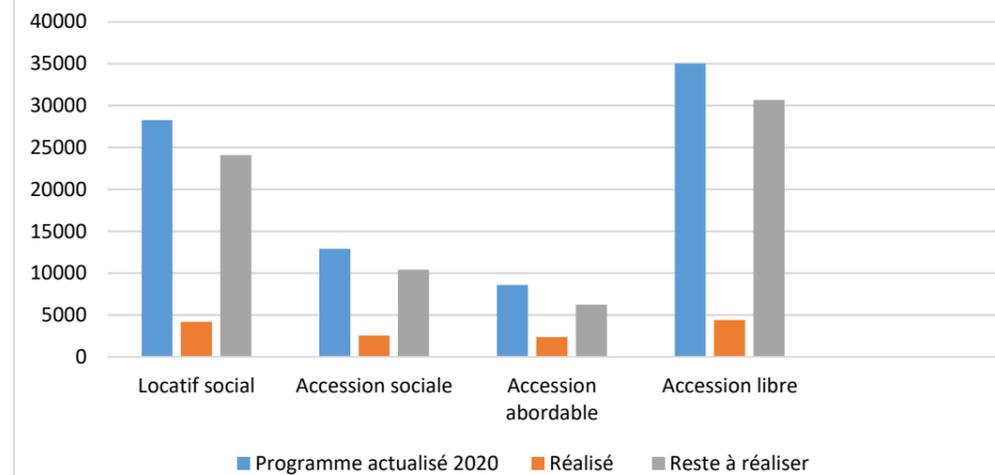

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

| Nature du programme | Programme actualisé 2021 | | Etat d'avancement | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------------|------------|
| | | | Réalisé | | Reste à réaliser | |
| | | % | | % | | % |
| Locatif social | 392 | | 64 | 16% | 328 | 84% |
| PLAI | 118 | | 19 | | 98 | |
| PLUS | 274 | | 45 | | 230 | |
| PLS | - | | - | | - | |
| Accession sociale | 169 | | 34 | 20% | 135 | 80% |
| Accession abordable | 107 | | 23 | 21% | 84 | 79% |
| Accession libre | 513 | | 70 | 14% | 443 | 86% |
| Sous total logements | 1 181 | | 191 | 16% | 990 | 84% |

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

