

ZAC Gradignan Centre-Ville - CRFA 2021
Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*

Nature du programme	Programme actualisé 2021		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SP	%	m ² SP	%	m ² SP	%
Locatif social	25320	30%	1883	7%	23437	93%
Accession sociale	11816	14%	0	0%	11816	100%
Accession abordable	11816	14%	0	0%	11816	100%
Accession libre	35448	42%	0	0%	35448	100%
Sous total logements	84 400	100%	1883	7%	82 517	98%
Commerces - services - activ	10 200		0	0%	10 200	100%
Total	94 600		0	0%	94 600	100%


* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

Nature du programme	Programme actualisé 2021		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	nbre	%	nbre	%	nbre	%
Locatif social	300		66	22%	234	78%
Accession sociale	140		0	0%	140	100%
Accession abordable	140		0	0%	140	100%
Accession libre	420		0	0%	420	100%
Sous total logements	1000		66	22%	934	93%

* à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP

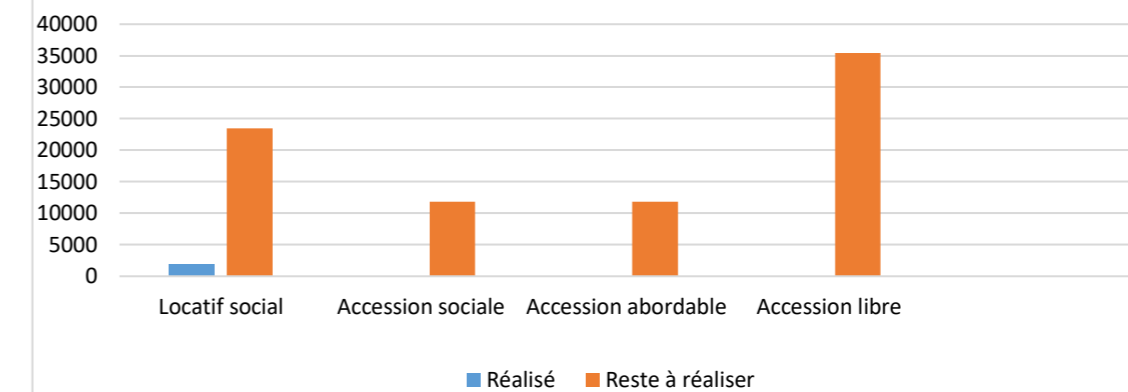

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements

