

PAE des Bassins à flot

Etat d'avancement des équipements publics au 31 août 2023

Côté Chartrons

Côté Bacalan

Espace sportif de proximité 1
« îlot P10 » Préau sportif
Livraison fin 2025

Espace sportif de proximité 2
Livraison ?

Structure petite enfance 1
60 places

Locaux associatifs et salle polyvalente
Livraison été 2025

Groupe scolaire BAF 3 :
Hors PAE

Groupe scolaire 1
« Sempé » : 14 classes
Livré 2021

Crèche « Pilpoul »
60 places
Livrée 2021


Micro-crèche : 10 places
Mise en service 2018

Groupe scolaire 2 + équipement polyvalent à vocation notamment culturelle
16 classes
Livré 2021

Point relais petite enfance
Livraison ?

Gymnase
Livraison T1 2024

Structure d'animation Ouagadougou
Livraison ?

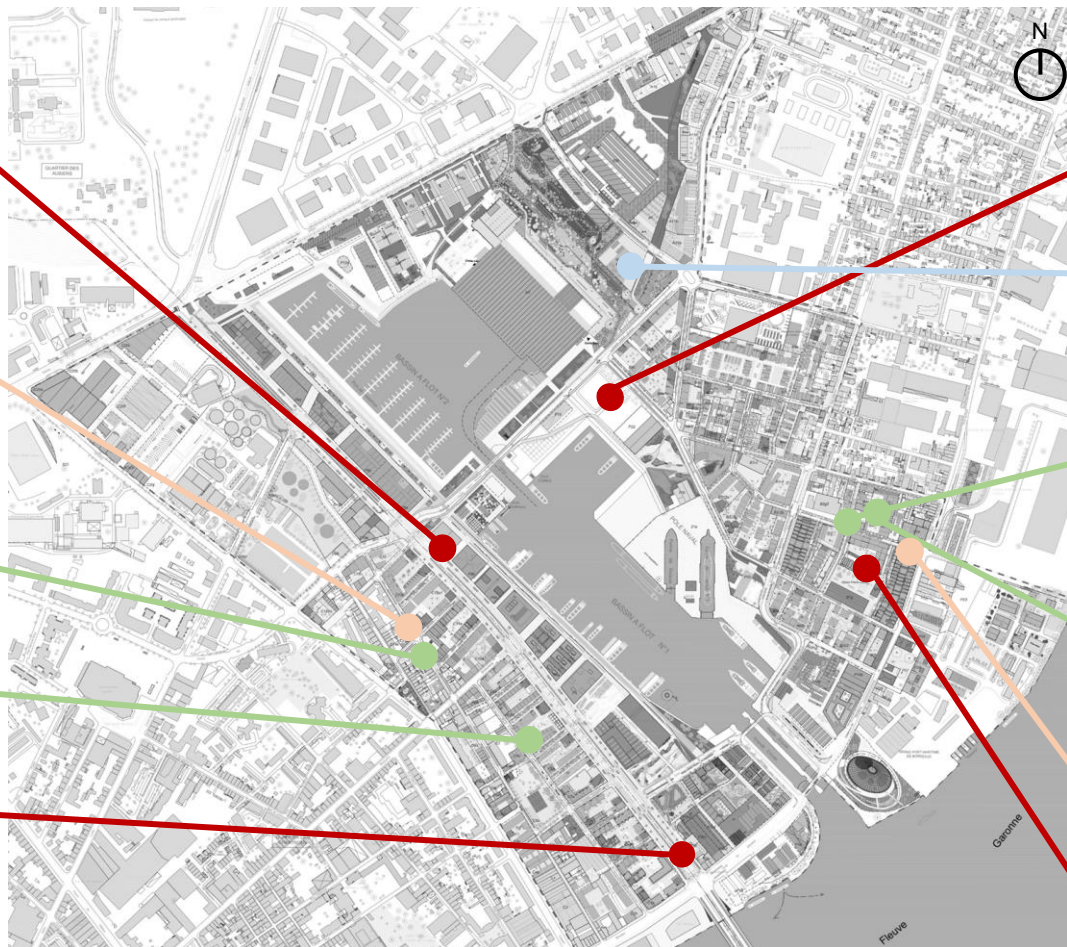

27/11/2023

En travaux
 Reste à réaliser
 Réalisé
 Hors PAE
