Step de Clos de Hilde

Travaux de réparation des parois des canaux des DENSADEGS C,D & E

planning previsionnel Rev E
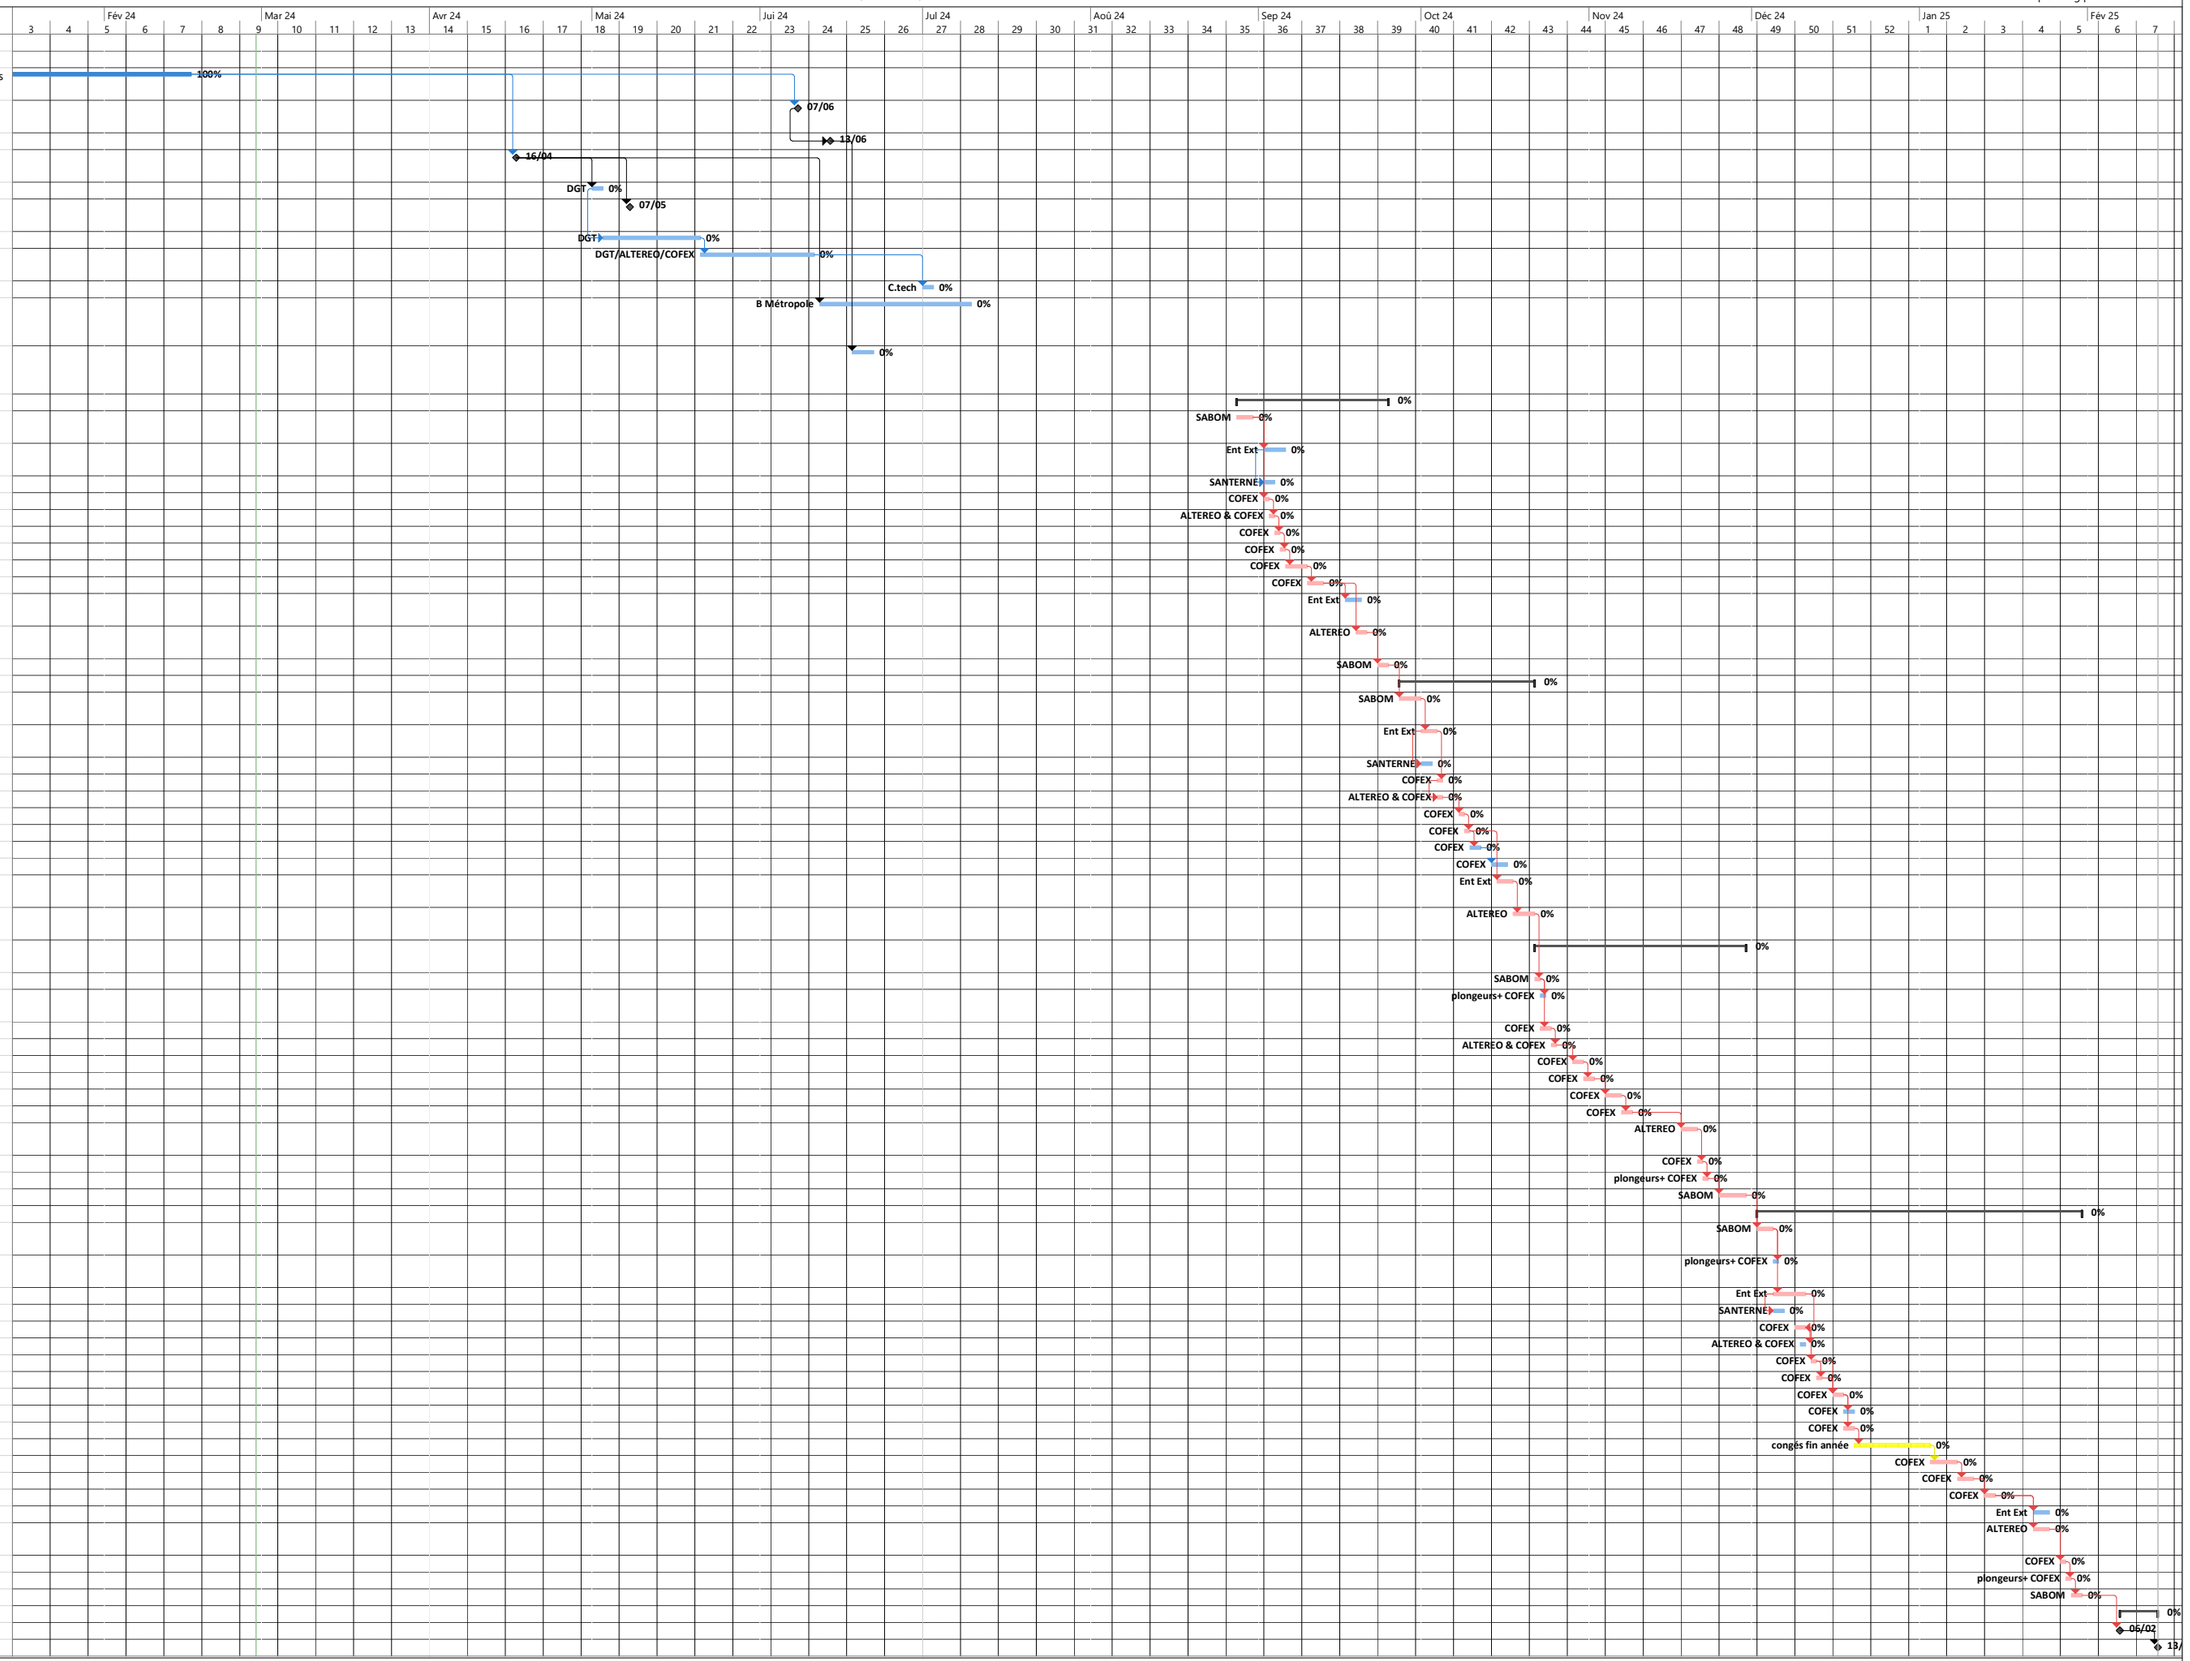
N°	Nom de la tâche	Durée
1	Consultation des entreprises	15 jours
2	Présentation plan action	0 jour
3	Concertation et formalisation accord transactionnel	145 jours
4	Présentation du protocole au conseil d'administration Agglomération	1 jour
5	Notification du protocole transactionn	0 jour
6	Réunion de coordination technique entreprises , exploitation	0 jour
7	Mise à jour du planning des travaux	2 jours
8	Accord de la police de l'eau sur le planning	0 jour
9	Commande des travaux par Degremon	12 jours
10	Etudes et préparation et approvisionnement	15 jours
11	Visa par contrôleur technique	2 jours
12	Commande des travaux par Bordeaux Métropole ou exploitation (SPS, CT, travaux annexes)	20 jours
13	Formalisation du plan de prévention et installation de Chantier et PPSPS des entreprises	4 jours
14	**Phase 1 -Travaux Densadeg D**	**20 jours**
15	Arrêt et consignation et vidange ouvrage D en Amont et Aval	3 jours
16	Dépose des goulottes et passerelles	4 jours
17	Déplacement des cables	2 jours
18	installation chantier	1 jour
19	Inspection et diagnostic GC	1 jour
20	hydro démolition Canal D	1 jour
21	hydro démolition parois D	1 jour
22	Réparation parois D	2 jours
23	Réparation canal D	3 jours
24	Repose des goulottes et passerelle	3 jours
25	Contrôle Pafait achévement Densadeg D avec delai séchage	2 jours
26	Remise en route Densadeg D	2 jours
27	**Phase 2 -Travaux Densadeg C**	**17 jours**
28	Arrêt et consignation et vidange ouvrage C en Amont et Aval	2 jours
29	Dépose des goulottes et passerelle	3 jours
30	Déplacement des cables	2 jours
31	installation chantier	1 jour
32	Inspection et diagnostic GC	1 jour
33	hydro démolition Canal C	1 jour
34	hydro démolition parois C	1 jour
35	Réparation parois C	2 jours
36	Réparation canal C	3 jours
37	Repose des goulottes et passerelle	3 jours
38	Contrôle Pafait achévement Densadeg C avec delai séchage	2 jours
39	**Phase 3 -Travaux Critiques-Canaux Communs**	**29 jours**
40	Arrêt et consignation ouvrages C & D	1 jour
41	Pose de l'obturateur dans le canal sortie commune Densadegs C&D	1 jour
42	installation chantier Canaux commu	2 jours
43	Inspection et diagnostic GC	1 jour
44	Hydro démolition Canal Sortie	2 jours
45	Hydro démolition Canal Rejet	2 jours
46	Réparation Canal Sortie	3 jours
47	Réparation Canal Rejet	2 jours
48	Contrôle Pafait achévement Densadeg E avec delai séchage	3 jours
49	Repli chantier Canaux communs	1 jour
50	Dépose de l'obturateur sécurisé	1 jour
51	Remise en route Densadegs C & D	5 jours
52	**Phase 4 -Travaux Densadeg E**	**44 jours**
53	Arrêt et consignation et vidange ouvrage E	3 jours
54	Pose de l'opturateur dans le canal sortie Densadeg E	1 jour
55	Dépose des goulottes et passerelles	4 jours
56	Déplacement des cables	2 jours
57	installation chantier Densadeg E	2 jours
58	Inspection et diagnostic GC	1 jour
59	hydro démol Canal densadeg E	1 jour
60	hydro démol parois densadeg E	1 jour
61	Hydro démolition Canal Sortie	2 jours
62	Hydro démolition Canal Rejet	2 jours
63	Réparation parois E	2 jours
64	Interruption de chantier fin d'année	10 jours
65	Réparation Canal E	3 jours
66	Réparation Canal Sortie	3 jours
67	Réparation Canal Rejet	2 jours
68	Repose des goulottes et passerelle	3 jours
69	Contrôle Parfait achévement Densadeg E avec delai séchage	3 jours
70	Repli chantier Desandeg E	1 jour
71	Dépose de l'obturateur sécurisé	1 jour
72	Remise en route Densadeg E	2 jours
73	**Réception des travaux**	**5 jours**
74	remise des DOE	0 jour
75	Réception des travaux	0 jour
