





N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Mai		Tri 3, 2022		Tri 4, 2022		Tri 1, 2023		Tri 2, 2023		Tri 3, 2023		Tri 4, 2023	
							Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui
62	Analyse comparative de chaque scénario (base & variante) : technique, économique, financière Nota : pas de comparaison à une référence	25 jours	Mer 18/10/23	Mar 21/11/23	61														
63	Montages juridiques, Aspects contractuels sur la fourniture de chaleur	25 jours	Mer 18/10/23	Mar 21/11/23	61														
64	Montages financiers : schémas d'investissement basés sur consultation banque et fond d'investissement	25 jours	Mer 18/10/23	Mar 21/11/23	61														
65	Etude des risques : analyse de sensibilités, cartographie des risques	25 jours	Mer 18/10/23	Mar 21/11/23	61														
66	Réunion de rendu de la phase - COTECH ESR	1 jour	Mer 22/11/23	Mer 22/11/23	65														
67	<b>D4/ Synthèse</b>	<b>16 jours</b>	<b>Jeu 23/11/23</b>	<b>Jeu 14/12/23</b>															
68	Rédaction du rapport final	10 jours	Jeu 23/11/23	Mer 06/12/23	66														
69	Réunion de présentation finale - UB	1 jour	Jeu 07/12/23	Jeu 07/12/23	68														
70	Réunion de pré-consultations futurs candidats MPPG	15 jours	Jeu 23/11/23	Mer 13/12/23	66														
71	Réunion avec les Elus - COPIL ESR	1 jour	Jeu 14/12/23	Jeu 14/12/23	70														
72	<b>D5/ Mise en place MPPG</b>	<b>317 jours</b>	<b>Lun 20/02/24</b>	<b>Mar 07/05/24</b>															
73	Redaction CCTP	35 jours	Mar 15/08/23	Lun 02/10/23	53														
74	Redaction CCAP RC AE	40 jours	Mar 03/10/23	Lun 27/11/23	73														
75	AAPC	1 jour	Mar 28/11/23	Mar 28/11/23	74														
76	DLRO	50 jours	Mer 29/11/23	Mar 06/02/24	75														
77	Analyse des offres	15 jours	Mer 07/02/24	Mar 27/02/24	76														
78	Dialogue compétitif	30 jours	Mer 28/02/24	Mar 09/04/24	77														
79	Analyse des offres	15 jours	Mer 10/04/24	Mar 30/04/24	78														
80	Validation	5 jours	Mer 01/05/24	Mar 07/05/24	77;79														
81	Demande de subvention ADEME	180 jours	Lun 20/02/24	Ven 27/10/24															
82	<b>D6/ Mise en place Société de projet</b>	<b>220 jours</b>	<b>Mar 15/08/23</b>	<b>Lun 17/06/24</b>															
83	Constitution de la société de projet	220 jours	Mar 15/08/23	Lun 17/06/24	53														
84	Choix plan A ou plan B	15 jours	Mer 08/05/24	Mar 28/05/24	80														
85	Création de la société de projet	1 jour	Mer 29/05/24	Mer 29/05/24	84														
86	Notification du prestataire	1 jour	Jeu 30/05/24	Jeu 30/05/24	85														
87	<b>E/ Phase conception réalisation</b>	<b>460 jours</b>	<b>Ven 31/05/24</b>	<b>Jeu 05/03/25</b>															
88	Etudes	80 jours	Ven 31/05/24	Jeu 19/09/24	86														
89	Travaux reseau	300 jours	Ven 20/09/24	Jeu 13/11/25	88														
90	Travaux sous stations	110 jours	Ven 20/09/24	Jeu 20/02/25	88														
91	Travaux échangeur	90 jours	Ven 20/09/24	Jeu 23/01/25	88														
92	Mise en service industrielle	60 jours	Ven 14/11/24	Jeu 05/02/25	89;90														
93	Reception	20 jours	Ven 06/02/25	Jeu 05/03/25	92														




Projet : ProjetRCU_2511022 Date : Ven 10/02/23	Tâche		Récapitulative		Jalon inactif		Durée uniquement		Début uniquement		Jalons externes		Progression manuelle	
	Fractionnement		Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Report récapitulatif manuel		Fin uniquement		Échéance			
	Jalon		Tâche inactive		Tâche manuelle		Récapitulatif manuel		Tâches externes		Avancement			



Projet : ProjetRCU\_2511022  
Date : Ven 10/02/23

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	Avancement
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	Progression manuelle

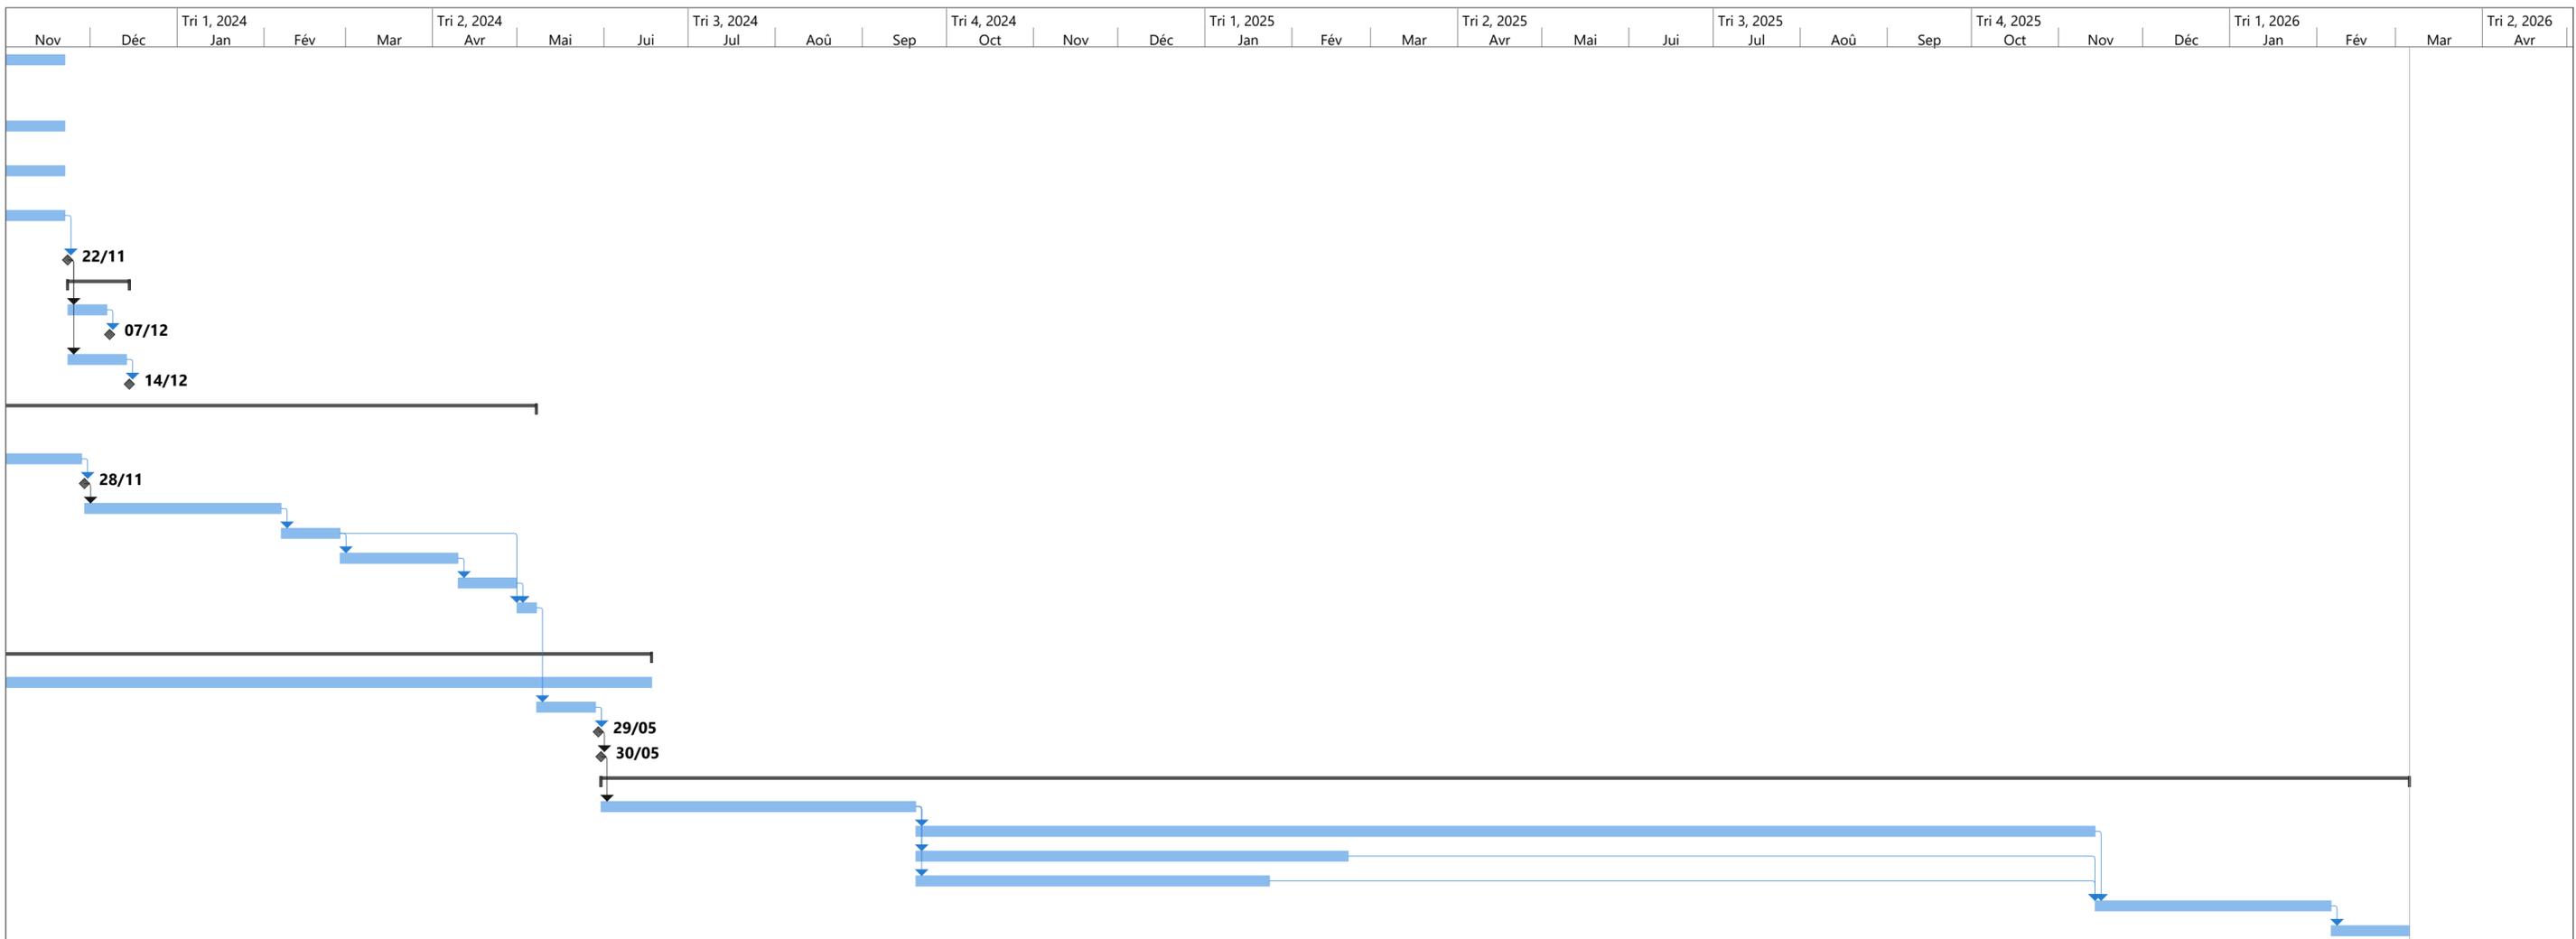

Projet : ProjetRCU\_2511022  
 Date : Ven 10/02/23

Tâche	Récapitulative	Jalon inactif	Durée uniquement	Début uniquement	Jalons externes	Progression manuelle
Fractionnement	Récapitulatif du projet	Récapitulatif inactif	Report récapitulatif manuel	Fin uniquement	Échéance	Avancement
Jalon	Tâche inactive	Tâche manuelle	Récapitulatif manuel	Tâches externes	Avancement	Progression manuelle
